




Netredegørelsen 2022 – Bilag 3.5B



Bilag 3.5B

Indhold

Side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3

TIB 1 – 35

5 - 10

2. S-banen

Oversigt over S-banen

4


TIB 810 – 880

11

Fjernbanen TIB 1, 2, 11, 21, 23, 24, 25 og 26

Netredefølgen 2022 - overblik 2023


- **Ringsted – Roskilde**
Sporombygning
- **Korsør**
Hastighedsopgradering
- **Sprogø - Korsør**
Tunnelarbejde
- **Middelfart - Nyborg**
Middelfart – Nyborg
- **Næstved – Lundby**
Tredjeparts-projekt
- **Vordingborg - Orehoved**
Storstrømsbroen, Ringsted Femern
- **Nykøbing F Vest**
Ringsted Femern
- **Nykøbing F. V - Rødby Færge**
Ringsted Femern
- **Odense – Fruens Bøge**
Forberedende arbejder EP Fredericia - Aarhus, broarbejder
- **Fredericia – Vejle**
Ballastrensning
- **Vejle – Horsens + Hørning – Aarhus**
Forberedende arbejder EP Fredericia - Aarhus, broarbejder
- **Skørping – Lindholm**
Sporombygning, Hastighedopgradering + Aalborg St.
- **Kolding - Vamdrup**
Fredericia – Padborg sporombygning

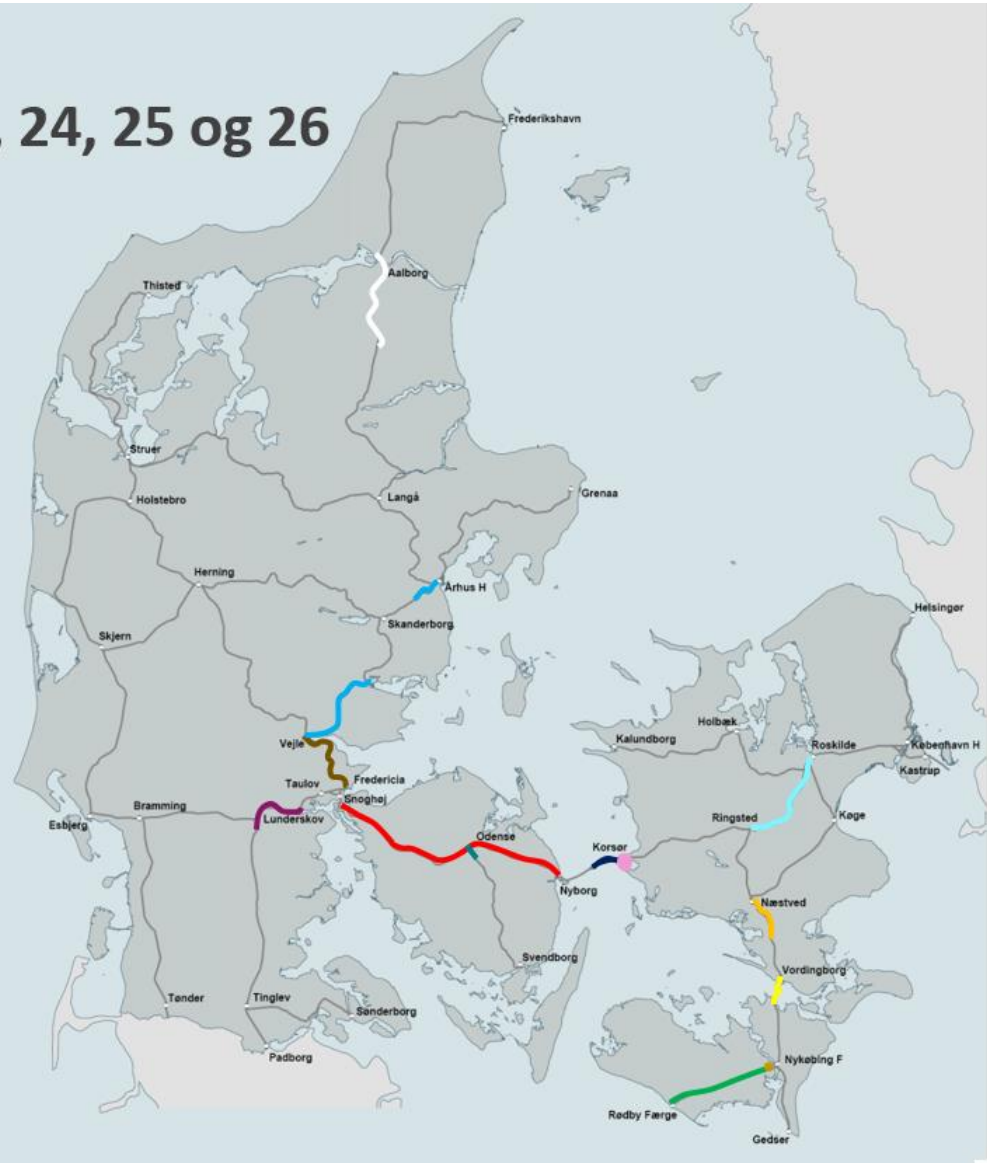

S-banen

Netredegørelsen 2022 - overblik 2023

- Jægersborg - Hillerød
Signalprogrammet
- Ny Ellebjerg - Hellerup
Signalprogrammet

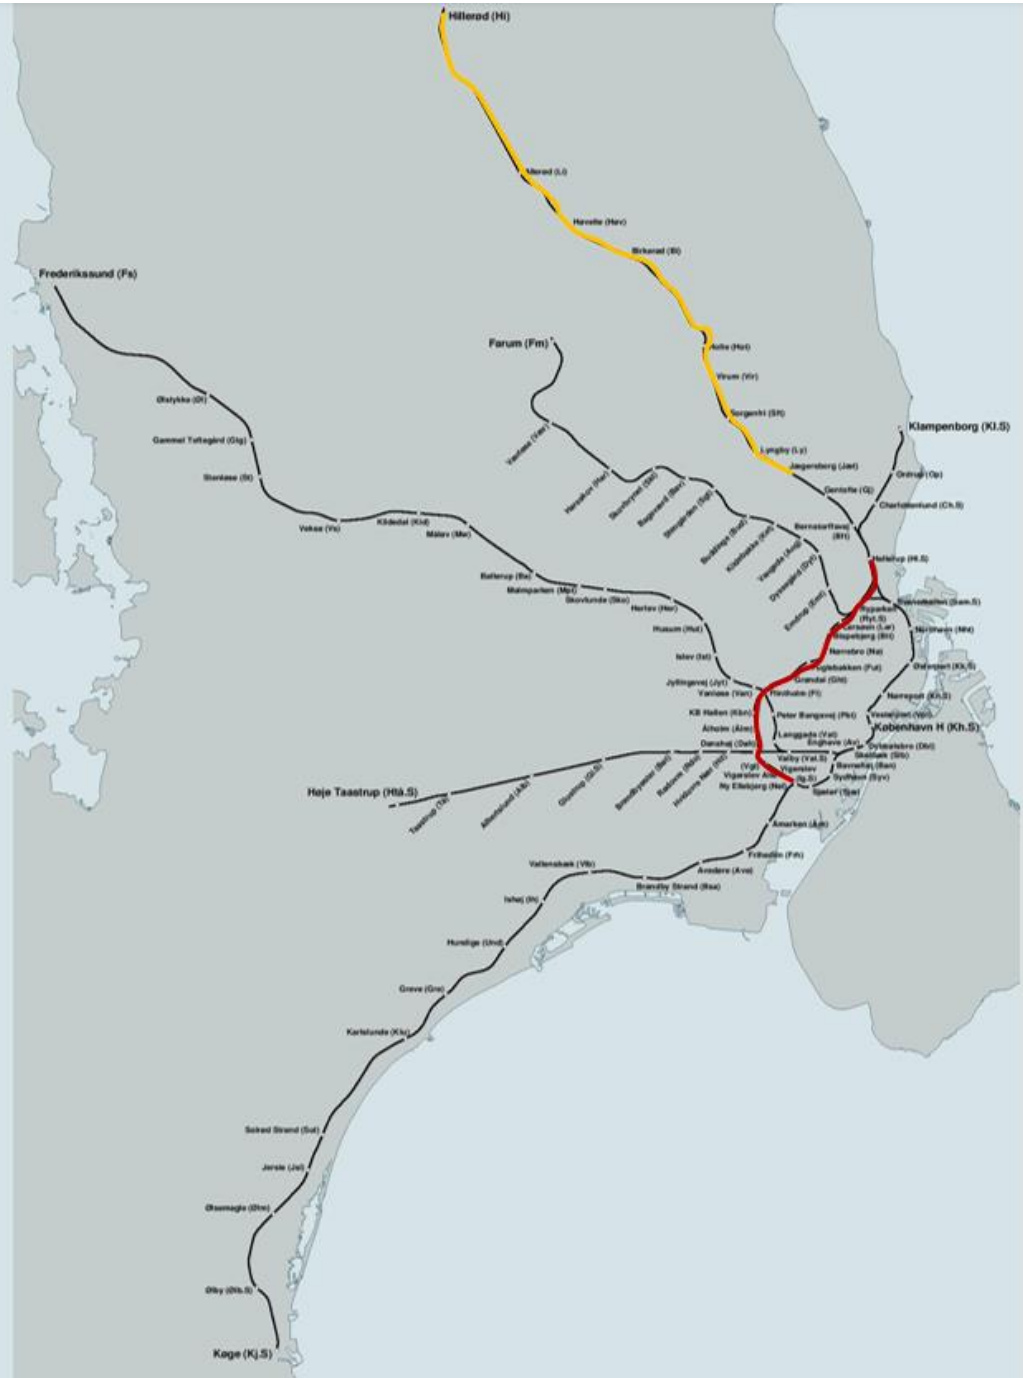

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	1	Ringsted (ekskl.) – Roskilde (ekskl.)	Sporombygning	Spor og broarbejder		Maj-August	27/5 – 13/8	11 uger enkeltsporsspærring Der spærres ét spor ad gangen på strækningen Ro-Rg.	Banedanmark	Major
2	1	Korsør (inkl.)	Hastighedsopgradering	Udskiftning af 12 sporskifter	5 døgn	Juli	22/07 – 31/07	Totalspærring	Sund og Bælt	Medium
3	1	Sprogø (inkl.) – Korsør (inkl.)	Renovering af pumpeumpe	Tunnelarbejde	2 uger	Juni	02/06 – 18/06	Spærring af 2.Hsp Kø-Spr uafbrudt i 15 døgn	Sund og Bælt	High
4	1	Sprogø (inkl.) – Korsør (inkl.)	Renovering af pumpeumpe	Tunnelarbejde	2 uger	Juni - Juli	18/06 – 03/07	Spærring af 1.Hsp Spr-Kø uafbrudt i 15 døgn	Sund og Bælt	High
5	1	Nyborg (ekskl.) – Ullerslev (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 132-141 (Nyborg - Ullerslev)	22 døgn	Maj – Juni	24/05 – 15-06	Venstresporskørsel Nyborg-Ullerslev	Banedanmark	High
6	1	Ullerslev (ekskl.) – Nyborg (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 132-141 (Nyborg - Ullerslev)	22 døgn	Juni – Juli	15/06 – 07-07	Venstresporskørsel Ullerslev-Nyborg	Banedanmark	High
7	1	Nyborg (ekskl.) – Odense (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Blødbundsuds kiftning Km 132-160 (Nyborg - Odense)	12 døgn	Juli	07/07 – 20/07	Totalspærring	Banedanmark	High
8	1	Ullerslev (ekskl.) – Marslev (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 141-151 (Ullerslev - Marslev)	11 døgn	Juli	20/07 – 31/07	Venstresporskørsel Ullerslev-Marslev	Banedanmark	High
9	1	Marslev (ekskl.) – Ullerslev (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 141-151 (Ullerslev - Marslev)	25 døgn	Juli - August	31/07 – 25/08	Venstresporskørsel Marslev-Ullerslev	Banedanmark	High
10	1	Marslev (ekskl.) – Odense (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 151- 160 (Marslev - Odense)	5 døgn	August	25/08 – 30/08	Venstresporskørsel Marslev-Odense	Banedanmark	Medium
11	1	Odense (ekskl.) – Marslev (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 151- 160 (Marslev - Odense)	27 døgn	August - September	30/08 – 26/09	Venstresporskørsel Odense-Marslev	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
12	1	Odense (inkl.) – Odense (inkl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Afvandingsarbejder mellem spor 2 & 3 Odense Station	Uafklaret	Sommer	Sommer	Spærring af spor 2 & 3	Banedanmark	*
13	1	Odense (inkl.) – Odense (inkl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejder i B-spor	50 døgn	Sommer	Sommer	Totalspærring af B-spor	Banedanmark	Major
14	1	Odense (inkl.) – Holmstrup (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 161.4-162.4 & Km 168-170	11 døgn	September – Oktober	26/09 – 07/10	Spærring af spor 5 Venstresporskørsel Odense-Holmstrup	Banedanmark	High
15	1	Holmstrup (ekskl.) – Odense (inkl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 161.4-162.4	11 døgn	Oktober	07/10 – 18/10	Spærring af spor 4 Venstresporskørsel Holmstrup-Odense	Banedanmark	High
16	1	Ejby (ekskl.) – Aarup (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 185-187	3 døgn	Oktober	19/10 – 22/10	Venstresporskørsel Ejby-Aarup	Banedanmark	Medium
17	1	Kauslunde (ekskl.) – Middelfart (ekskl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde Km 205,3-209,5	3 døgn	Oktober	22/10 – 25/10	Venstresporskørsel Kauslunde-Middelfart	Banedanmark	Medium
18	2	Næstved (ekskl.) – Lundby (ekskl.), Mogenstrup	RFB 3 parts projekt (DSB)	Forberedelse og ilægning af sporskifter	3 weekender	Marts-juni	Ikke fastlagt	Totalspærring af begge hovedspor	Banedanmark	Medium
19	2	Lundby (ekskl.) – Næstved (ekskl.), Mogenstrup	RFB 3 parts projekt (DSB)	Arbejder med linjeføring, tilpasning af spor mm.	2 weekender	Marts-juni	Ikke fastlagt	Højre spor	Banedanmark	Medium
20	2	Vordingborg (ekskl.) – Orehoved (ekskl.)	RFB	Etablering af den ene sporforbindelse til Ny Storstrømsbro	Tidsplan udestår	Marts-april	Marts-April	Totalspærring	Banedanmark	*
21	2	Vordingborg (ekskl.) – Orehoved (ekskl.)	RFB	Etablering af den anden sporforbindelse til Ny Storstrømsbro	Tidsplan udestår	September -Oktober	Ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	*
22	2	Nykøbing F Vest (inkl.)	RFB	Placering af materiel mm. Rangering til og fra arbejdssporet	Hele året	Hele året	Ikke fastlagt	Spor 1 (I-signal D til U-signal B) Lokaltog kan komme til Nykøbing F. st.	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								LA40 omkring Frederiks D IX's bro ca. 1,2 km, varighed hele året.		
23	2	Nykøbing F Vest (inkl.)	RFB	Ilægning af nye sporskifter	Tidsplan udestår	-	Ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	*
24	2	Nykøbing F Vest (ekskl.) – Rødby Færges (inkl.)	RFB	Blødbundsarbejder, forberedelser til dobbeltspor	Hele året	Hele året	Ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Major
25	21	Odense (inkl.) – Fruens Bøge (inkl.)	NFSP0516 & NA0037 Middelfart - Nyborg sporfornyelse og hastighedsopgradering	Sporarbejde km 161.4-162.4	11 døgn	26-06 (aften)	07-07 (aften)	Totalspærring Odense-Fruens Bøge	Banedanmark	High
26	23	Fredericia (Inkl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Flytning af DVsignal, ny sporkasse, udveksling af sporskifter, mv.	Uafklaret	2 + 3 kvartal	13/5 – 15/8	Lægger i ly af arbejdet imellem Fa-Bk ballastrensning	Bdk	*
27	23	Fredericia (inkl.) – Vejle (inkl.)	Ballastrensning Fredericia - Vejle	Ballastrensning + sporfornyelse	90 døgn	2 + 3 kvartal	13/5 – 15/8	Enkelsporsdrift enten Fredericia – Børkop / Børkop – Fredericia / Børkop – Vejle / Vejle – Børkop	Banedanmark	Major
28	23	Vejle (inkl.) – Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20596	1 x weekendspærringer	Februar	24/2-26/2	Totalspærring	Banedanmark	Medium
29	23	Vejle (inkl.) – Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20596	4 x døgnspærring	Marts	3/3-6/3	Totalspærring	Banedanmark	Medium
30	23	Vejle (ekskl.) – Hedensted (ekskl.)		Omisolering af broer	6 uger + en weekend	3 kvartal	07/7-21/8	Alle tog ad venstre spor enten Vj-Hed eller hed-Vj	BDK	Major
31	23	Vejle (inkl.) – Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20596	1 x weekendspærringer	Oktober	20/10-22/10	Totalspærring	Banedanmark	Medium
32	23	Vejle (inkl.) – Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20596	4 x døgnspærring	Oktober	28/10-31/10	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
33	23	Hedensted (inkl.) – Horsens (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	1 x weekendspærringer	Februar	23/2-25/2	Totalspærring begge spor Hedensted – Horsens	Banedanmark	Medium
34	23	Hedensted (inkl.) – Horsens (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	4 x døgnspærringer	Marts	3/3-6/3	Totalspærring begge spor Hedensted – Horsens	Banedanmark	Medium
35	23	Hedensted (inkl.) – Horsens (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	10 x døgnspærringer	Marts	7/3-16/3	Venstresporskørsel Horsens – Hedensted	Banedanmark	High
36	23	Hedensted (inkl.) – Horsens (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	2 x døgnspærringer	Marts	17/3-18/3	Venstresporskørsel Hedensted - Horsens	Banedanmark	Medium
37	23	Hedensted (inkl.) – Horsens (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20660	1 x weekendspærringer	Maj	5/5-7/5	Totalspærring begge spor Hedensted – Horsens	Banedanmark	Medium
38	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Brohævning Bro 20846	1 x døgnspærring	Juni	24/6	Venstresporskørsel Hørning – Aarhus	Banedanmark	Medium
39	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Brohævning Bro 20846	1 x weekendspærring	Juli	28/7-30/7	Venstresporskørsel Hørning – Aarhus	Banedanmark	Medium
40	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Brohævning Bro 20848	3 mdr. døgnspærring	Juni-august	1/6-31/8	Venstresporskørsel Aarhus – Hørning	Banedanmark	Major
41	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Brohævning Bro 20848	2 x weekendspærring	Juni-august	11/6-13/6 30/7-1/8	Totalspærring Hørning – Aarhus	Banedanmark	High
42	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Brohævning Bro 20848	8 x døgnspærring	December	8/12-16/12	Venstresporskørsel Hørning – Aarhus	Banedanmark	High
43	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Udskiftning af brodæk Bro 20852	3 måneder døgnspærring	Juni-august	1/6– 31/8	Venstresporskørsel Aarhus – Hørning	Banedanmark	Major
44	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Sideflytning af spor Bro 20876	21 døgnspærringer	3. kvartal	Ikke fastlagt	Aarhus: Al trafik til/fra syd igennem spor 30, 40 og 80.	Banedanmark	High
45	23	Hørning (inkl.) – Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Sideflytning af spor Bro 20876	21 døgnspærringer	3. kvartal	Ikke fastlagt	Aarhus: Al togtrafik til/fra syd	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								46igennem spor 30, 50 og 80 LA40 i spor 50		
46	24	Aalborg inkl. – Aalborg inkl.	Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg NF/SP/0473 og NA0034	Totalombygning af Aalborg Station indeholdende jord, broer, spor og sikring. Derudover udføres diverse broarbejder på strækningen Hb – Ab i ly af Aalborg Station	B spor, samt områder, hvor trafikken ikke berøres	April-august	6/4 -18/8	Evt. længere rangerbevægelser i denne periode, samt adgang til spor 0 kan berøres	Banedanmark	*
47	24	Svenstrup (ekkl.) – Aalborg (Inkl.)	Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg NF/SP/0473 og NA0034	Totalombygning af Aalborg Station indeholdende jord, broer, spor og sikring. Derudover udføres diverse broarbejder på strækningen Hb – Ab i ly af Aalborg Station	Sydende: 8 ugers totalspærring,	April-august	6/4 -18/8	Totalspærring, kun Aalborg st, tog vender i Svenstrup, bus Svenstrup - Aalborg	Banedanmark	Major
48	24	Skørping (eksl.) – Aalborg (Inkl.)	Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg NF/SP/0473 og NA0034	Totalombygning af Aalborg Station indeholdende jord, broer, spor og sikring. Derudover udføres diverse broarbejder på strækningen Hb – Ab i ly af Aalborg Station	Sydende: 2 ugers totalspærring,	April-august	6/4 -18/8	Totalspærring	Banedanmark	Major
49	25	Aalborg (inkl.) – Lindholm (Ekskl.)	Sporombygning og hastighedsopgradering Hobro – Aalborg NF/SP/0473 og NA0034	Totalombygning af Aalborg Station indeholdende jord, broer,	Nordende: 10 ugers totalspærring.	April-august	6/4 -18/8	Totalspærring,	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
				spor og sikring. Derudover udføres diverse broarbejder på strækningen Hb – Ab i ly af Aalborg Station						
50	26	Kolding (inkl.) – Lunderskov (Inkl.)	Sporombygning Fredericia - Padborg	Ballstrensning + sporfornyelse	17 døgn	Juli	14/7 – 30/7	Venstresporskørsel Kolding - Lunderskov	Banedanmark	High
51	26	Lunderskov (inkl.) – Vamdrup (inkl.)	Sporombygning Fredericia - Padborg	Ballstrensning + sporfornyelse	10 døgn	Juli-august	30/7 – 8/8	Venstresporskørsel Lunderskov - Vamdrup	Banedanmark	High
52	26	Vamdrup (inkl.) – Lunderskov (inkl.)	Sporombygning Fredericia - Padborg	Ballstrensning + sporfornyelse	8 døgn	August	8/8 – 15/8	Venstresporskørsel Vamdrup - Lunderskov	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	820 880	Jægersborg (inkl.) - Hillerød (inkl.) Ny Ellebjerg (inkl.) - Hellerup (inkl.)	Nyt signalsystem S-banen PSP: S/SB/BBFB-9-9-11160-SHBD	Ibrugtagning af "postponed deliveries"	1 weekend	Marts	25/3-27/3	Totalspærring	Banedanmark	*
