



Netredegørelsen 2021 – Bilag 3.5A

Bilag 3.5A

Indhold	side
----------------	-------------

2 Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 5

TIB 1 - 35

7 - 18

3 S-banen

Oversigt over S-banen

6

TIB 810 - 880

19 - 21

Fjernbanen TIB 1 & 2

Netredegørelsen 2021 overblik

-  **København H**
Renovering af Tietgensgadebroen,
København - Høje Taastrup
-  **København H - Hvidovre Fjern** (flere Strækninger TIB 1)
København - Høje Taastrup
-  **Glostrup - Høje Taastrup**
Hovedstadens Letbane v. Glostrup
-  **Slagelse St.**
Gangbro
-  **Fredericia - Snoghøj**
Fredericia station
-  **Middelfart - Fredericia**
Fredericia station
-  **Ringsted - Vordingborg** (flere strækninger TIB 2)
Elektrificeringsprogrammet
-  **Mogenstrup - Rødby Færge** (flere strækninger TIB 2)
Signalprogrammet
-  **Orehoved - Rødby Færge** (Flere strækninger TIB 2)
Ringsted-Femern



Fjernbanen TIB 5-11

Netredegerelsen 2021 - overblik

- **(Roskilde) – Holbæk**
Elektrificeringsprogrammet, immunisering
- **Vigerslev (TIB 6 og 11)**
Ny bane
- **Københavns Lufthavn Kastrup - Lernacken**
Broarbejder Øresundsbroen
- **Bavnehøj - Kalvebod**
Moderniseringsprojektet



Fjernbanen TIB 21-35

Netredefølrelsen 2021 overblik


- (Odense) - Svendborg**
Signalprogrammet
- Fredericia - Børkop, inkl. Fredericia St.**
Fredericia station
- Børkop - (Aarhus)**
Forberedende arbejder EP Fredericia - Aarhus, broprojekter
- (Aarhus) - (Hørning)**
Beder vejbro, 3. parts
- (Aarhus) - (Langå)** (flere strækninger TIB 24)
Sporombygning Aarhus - Langå
- Langå - Hobro**
Forberedende arbejder EP
- Taulov - Fredericia**
Fredericia Station
- Holstebro - Struer**
Signalprogrammet
- Struer - (Langå)** (flere strækninger TIB 32)
Signalprogrammet
- (Herning) - (Vejle)**
Signalprogrammet
- Hvidbjerg - Bedsted Thy**
Ledelinjer og ø-perroner
- Silkeborg - Svejlbæk**
Nordskovvej, 3. parts



S-banen

Netredefølrelsen 2021 overblik

-  **København H - Glostrup (flere strækninger)**
København - Høje Taastrup
-  **Glostrup - (Taastrup)**
Hovedstadens Letbane v. Glostrup
-  **Mange TIB strækninger (ikke markeret)**
Signalprogrammet
-  **(Allerød) - (Hillerød)**
Favrholm station
-  **Glostrup - (Taastrup)**
Hovedstadens Letbane V. Glostrup 3. parts
-  **(Herlev) - Ballerup**
Stitunnel Herlev
-  **Lersøen - (Nørrebro)**
Nordvestpassagen, fodgængerbro

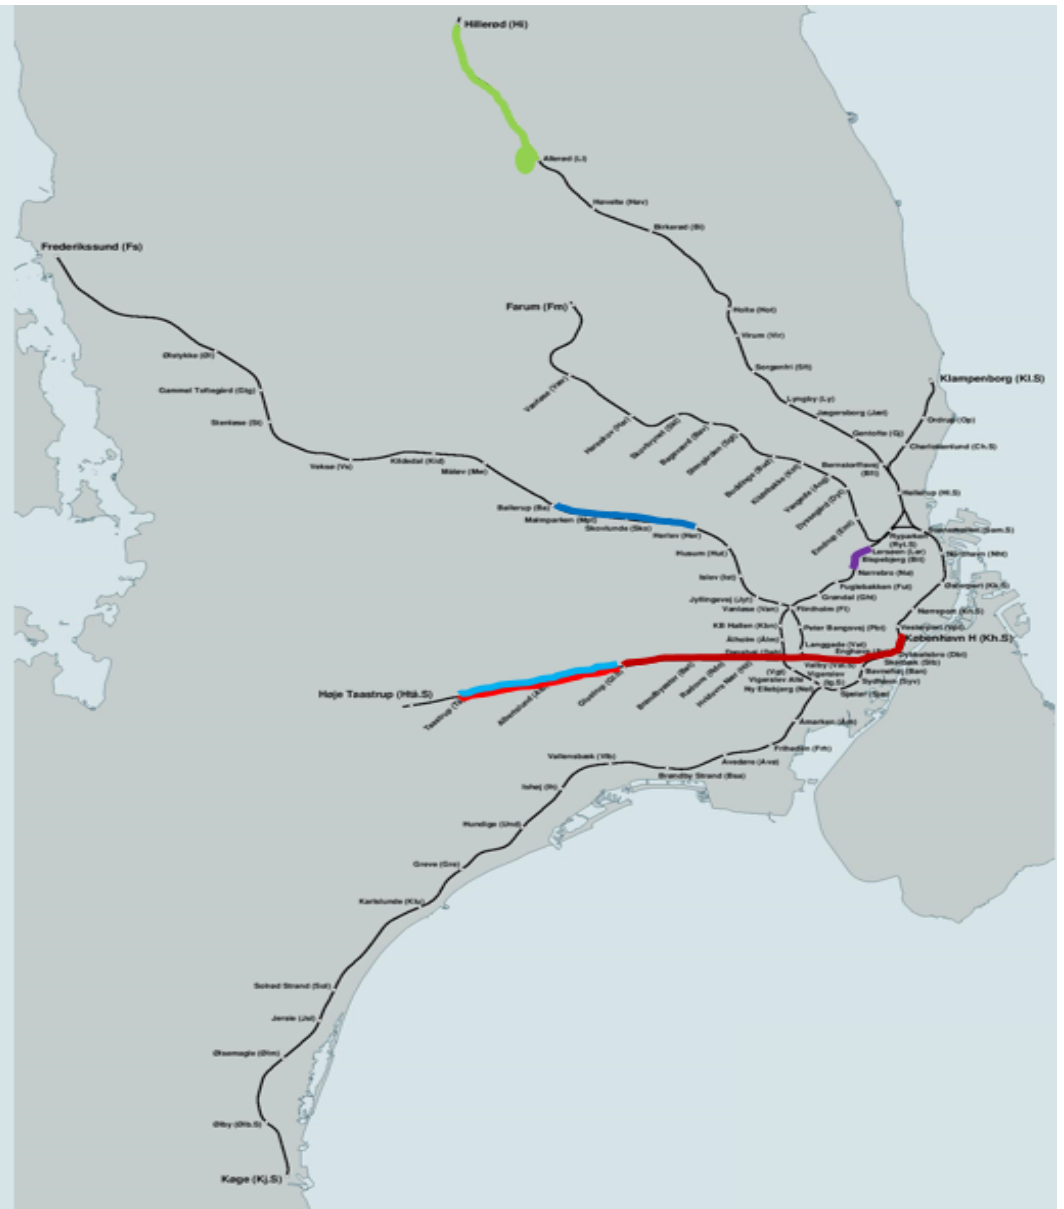

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	1	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	Tietgensgadebro, spor 3	Renovering af Tietgensgadebro spor 3	Spærring af spor 3, placeres i hhv. Bededagsferien, hvor spærring ligger i ly af København - Høje Taastrup projektet	April-maj	Første del ikke fastlagt samt 30/04 - 02/05 2021	Reduceret drift - Reduceret perronspor. Spærring i Bededagsferien ligger i ly af København - Høje Taastrup projektet	Banedanmark	*
2	1	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	Tietgensgadebro, spor 4 - 8	Renovering af Tietgensgadebro spor 4-8	Arbejde i spor 4-8, et spor døgnspærret 7 dage i træk, ugerne 27 - 32	Juli-august	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Reduceret perronspor. Spærringer ligger i ly af Københvan - Høje Taastrup projektet	Banedanmark	*
3	1	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	København H - Høje Taastrup	Udveksling af sporskifter	12 døgn	April	18/04-30/04	Det er ikke muligt at komme til/fra KGC i denne periode	Banedanmark	High
4	1	København H (Ekskl.) - Hvidovre Fjern (Inkl.)	København - Høje Taastrup	Omisolering af bro ved Vigerslevvej samt afvanding og sporarbejder	6 uger	April-juni	26/04-07/06	Reduceret drift - Højre spor Hvidovre Fjern - København H er spærret	Banedanmark	Major
5	1	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	København H - Høje Taastrup	Udveksling af sporskifter	12 døgn	April-juni	26/04-07/05	Reduceret drift - Tog skal ad venstrespor Hvidovre Fjern - København H eller via København G/Vigerslev	Banedanmark	High
6	1	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	København H - Høje Taastrup	Udveksling af sporskifter	3 døgn	Maj-maj	07/05-10/05	Reduceret drift - Der kan ikke køres via pladsen mod Valby. Rangeringer til/fra Belvedere skal foregå i andre spor	Banedanmark	*
7	1	København H (Ekskl.) - Hvidovre Fjern (Ekskl.)	København H - Høje Taastrup	Omisolering af bro samt spor og afvanding	6 uger	Juli-august	05/07-16/08	Reduceret drift - Tog skal af venstrespor København H - Hvidovre Fjern eller via København G/Vigerslev	Banedanmark	Major
8	1	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	København H - Høje Taastrup	Udveksling af sporskifter	12 døgn	Juli-juli	05/07-16/07	Reduceret drift - Grundet spærringen højrespor mellem København H - Hvidovre Fjern skal tog af venstrespor mod Hvidovre Fjern. Tog til/fra Belvedere rangeres i andre spor	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
9	1	Hvidovre Fjern (Inkl.) - Hvidovre Fjern (Inkl.)	København H - Høje Tåstrup	Ballastrensning	3 døgn	Maj-maj	28/05-31/05	Reduceret drift - Tog skal af venstrespor henholdsvis mellem Glostrup - København H, Glostrup - Vigerslev, i begge tilfælde med dobbelt venstrespor	Banedanmark	Medium
10	1	Hvidovre Fjern (Ekskl.) - Glostrup (Inkl.)	København H - Høje Tåstrup	Spør og afvandingsarbejder	2 uger	August-september	23/08-06/09	Reduceret drift - Tog skal af venstrespor mellem Hvidovre Fjern og Glostrup. Der kan køres trafik i spor 0 og 1	Banedanmark	High
11	1	Glostrup (Inkl.) - Hvidovre Fjern (Inkl.)	København H - Høje Tåstrup	Spør og afvandingsarbejder	2 uger	September-oktober	20/09-04/10	Reduceret drift - Tog skal ad venstrespor Glostrup - Hvidovre Fjern. Spor 1 i Hvidovre spærres frem til Pu-signal G1. Glostrup spor 1 spærres frem til sporskifte 02B eksklusiv. Togene skal kunne få signal KØR	Banedanmark	High
12	1	Glostrup (Inkl.) - Høje Tåstrup (Ekskl.)	Hovedstadens letbane ved Glostrup	2 stålbroer skal hejses ind over alle sporene ved Ringvejsbroen	1 weekend	Juli-juli	Ikke fastlagt	Alle spor spærret -	Hovedstadens Letbane (3. part)	Medium
13	1	Slagelse (Inkl.) - Slagelse (Inkl.)	Slagelse Gangbro	Gangbro	2 x 56 timer	Januar-december	Ikke fastlagt	Reduceret drift -	Slagelse Kommune (3. part)	Medium
14	1	Middelfart (Ekskl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifte, ny sporkasse	4 døgn og 6 timer	April-april	01/04-05/04	Reduceret drift - Højre spor Snoghøj-Fredericia spærret. Tog fra øst skal ad venstre spor fra Middelfart, da der ikke kan krydses over i Snoghøj. Spor 20 og 21 er spærret	Banedanmark	Medium
15	1	Fredericia (Inkl.) - Snoghøj (Ekskl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifte, ny sporkasse, flytning af DV-signal	48 timer	Marts-marts	24/03-26/03	Reduceret drift - Ingen kørestrøm i spor 10	Banedanmark	*
16	1	Fredericia (Inkl.) - Snoghøj (Ekskl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifte, ny sporkasse, flytning af DV-signal	56 timer	Marts-marts	26/03-29/03	Reduceret drift - Kørsel ad venstre spor Fredericia - Snoghøj, ingen kørestrøm i spor 10	Banedanmark	Medium
17	2	Ringsted (Ekskl.) - Vordingborg (Ekskl.)	Elektrificeringsprogrammet	9 timers natspæringer	3 måneder	Februar-maj	26/02-19/05	Reduceret drift -	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
18	2	Ringsted (Ekskl.) - Næstved (Ekskl.)	Elektrificeringsprogrammet	9 timers natspæringer	2 måneder	Januar-februar	01/01-25/02	Reduceret drift -	Banedanmark	*
19	2	Mogenstrup (Inkl.) - Rødby Færge (Inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Installation af sporskiftedrev	7 weekender á 56 timer	Januar-juni	Ikke fastlagt	- Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
20	2	Mogenstrup (Inkl.) - Orehoved (Inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Afprøvningskørsler	2 weekender á 56 timer	April-juni	Ikke fastlagt	- Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
21	2	Mogenstrup (Inkl.) - Orehoved (Inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Afprøvningskørsler	4 weekender á 56 timer	Juli-december	Ikke fastlagt	- Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
22	2	Mogenstrup (Inkl.) - Rødby Færge (iInkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Afprøvningskørsler	2 weekender á 56 timer	Oktober-december	Ikke fastlagt	- Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
23	2	Vordingborg (Inkl.) - Vordingborg (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Fjernelse af sporskifte	56 timer	Januar-december	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Ingen trafik fra Lundby til Vordingborg og omvendt i 56 timer. Efter totalspærring er sporskifte 06a/b fjernet. Ingen mulighed for kørsel til spor 1 ad højre spor Lundby - Vordingborg før Signalprogrammet ibrugtages	Banedanmark	Medium
24	2	Orehoved (Ekskl.) - Nykøbing Falster (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Sporombygning	Op til 3 måneder	April-juli	30/04-31/07	Alle spor spærret -	Banedanmark	Major
25	2	Orehoved (Inkl.) - Orehoved (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Sporombygning	Op til 3 måneder	April-juli	30/04-31/07	Reduceret drift - spor 2 er spærret. Der kan vendes tog i spor 1	Banedanmark	Major
26	2	Orehoved (Ekskl.) - Nykøbing Falster (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Midlertidigt signalsystem på Falster	Frem til ibrugtagning af Signalprogrammet	Juli-december	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Et tog i timen Orehoved - Nykøbing F i spor 3. To tog i timen Nykøbing F Vest - Nykøbing F uden gennemkørsels mulighed i Nykøbing F i spor 2	Banedanmark	Major
27	2	Orehoved (Inkl.) - Orehoved (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Fjernelse af sporskifter	56 timer	Januar-december	Ikke fastlagt	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
28	2	Orehoved (Ekskl.) - Rødby Færge (Inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Roll out 7	Afprøvningskørsler	4 weekender á 56 timer	Juli-december	Ikke fastlagt	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
29	2	Nørre Alslev (Inkl.) - Nørre Alslev (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Etablering af støttemur	30 døgn	Januar-maj	08/04-07/05	Reduceret drift - Ingen krydsningsmulighed på Nørre Alslev station, passagerudveksling i spor 2	Banedanmark	*
30	2	Nykøbing Falster (Inkl.) - Nykøbing Falster (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Forberedende arbejder til Signalprogrammet	127 døgn	Januar-maj	01/01-07/05	Reduceret drift - Ingen mulighed for kørsel fra og til Nykøbing F Vest til sporene 3, 4 og 5 samt kørsel til og fra Gedser-sporet	Banedanmark	*
31	2	Nykøbing Falster (Inkl.) - Nykøbing Falster (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Omisolering af bro	31 døgn	Marts-april	17/03-16/04	Reduceret drift - Ingen mulighed for togkørsel i spor 5 samt anvendelse af sidesporene 50, 53	Banedanmark	*
32	2	Nykøbing Falster (Inkl.) - Nykøbing Falster (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Omisolering af bro	21 døgn	April-maj	17/04-07/05	Reduceret drift - Ingen mulighed for togkørsel i spor 3 og 4	Banedanmark	*
33	2	Nykøbing Falster (Inkl.) - Nykøbing Falster (Inkl.)	Ringsted-Femern banen	Midlertidigt sikringsanlæg frem til ibrugtagning af Signalprogrammet	Frem til ibrugtagning af signalprogrammet	Juli-december	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Trafik afvikles i spor 2 og 3 med adgang til "Skoven". Et spor til rådighed for Lollandsbanen og et spor til Sydbanen	Banedanmark	*
34	2	Nykøbing Falster vest (Ekskl.) - Rødby Øst (Ekskl.)	Ringsted-Femern banen	Etablering af dobbeltspor, sporarbejder samt nedlæggelse af akseltæller	8 måneder	April-december	30/04-31/12	Alle spor spærret - Ingen mulighed for kørsel mellem Nykøbing Falster Vest og Rødby Øst	Banedanmark	Major
35	5	Roskilde (Ekskl.) - Holbæk (Inkl.)	Elektrificeringsprogrammet	9 timers natspæringer	9 måneder	Januar-oktober	01/01-01/11	Reduceret drift -	Banedanmark	*
36	5	Roskilde (Ekskl.) - Holbæk (Inkl.)	Immunisering	Alle spor spærret på én station af gangen på strækningen	4 weekender	Juli-december	Ikke fastlagt	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
37	6	Vigerslev (Inkl.) - Vigerslev (Inkl.)	Ny Bane	Sikringsteknisk ibrugtagning	8 døgn	Marts-april	26/03-02/04	Reduceret drift -	Banedanmark	High
38	6	Vigerslev (Inkl.) - Vigerslev (Inkl.)	Ny Bane	Sikringsteknisk ibrugtagning	3 døgn	April-april	02/04-04/04	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
39	11	Københavns Lufthavn Kastrup (Ekskl.) - Lernacken	Broarbejder	Broarbejde	24 timer fra lørdag kl. 13.00 - søndag kl. 13.00 (uge 11)	Marts-marts	20/03-21/03	Alle spor spærret -	Øresundsbroen/-Trafikverket, 3. part	Medium
40	11	Københavns Lufthavn Kastrup (Ekskl.) - Lernacken	Broarbejder	Broarbejde	24 timer fra lørdag kl. 13.00 - søndag kl. 13.00 (uge 44)	November-november	06/11-07/11	Alle spor spærret -	Øresundsbroen/-Trafikverket, 3. part	Medium
41	11	Bavnehøj F (Inkl.) - Kalvebod (Inkl.)	Moderniseringsprojektet	Installation af neutralsektioner	1 døgn	Januar-september	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Kørestrømsafbrydelse Kalvebod - Bavnehøj	Banedanmark	Medium
42	11	Bavnehøj F (Inkl.) - Kalvebod (Inkl.)	Moderniseringsprojektet	Bore- og forberedende arbejde	2 weekender á 48 timer	Januar-september	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Kørestrømsafbrydelse	Banedanmark	Medium
43	11	Bavnehøj F (Inkl.) - Kalvebod (Inkl.)	Moderniseringsprojektet	Installation af neutralsektionerne	1 døgn á 24 timer	Januar-september	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Kørestrømsafbrydelse	Banedanmark	Medium
44	11	Kalvebod (Inkl.) - Bavnehøj (Inkl.)	Moderniseringsprojektet	Bore- og forberedende arbejde	2 weekender á 48 timer	Januar-september	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Kørestrømsafbrydelse	Banedanmark	Medium
45	11	Vigerslev (Inkl.) - Vigerslev (Inkl.)	Ny Bane	Sikringsteknisk ibrugtagning	8 døgn	Marts-april	26/03-02/04	Reduceret drift -	Banedanmark	High
46	11	Vigerslev (Inkl.) - Vigerslev (Inkl.)	Ny Bane	Sikringsteknisk ibrugtagning	3 døgn	April-april	02/04-04/04	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
47	21	Odense (Ekskl.) - Svendborg (Inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 10	Testkørsler Signalprogram	7 weekender á 56 timer	Januar-juni	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Alle tog aflyses	Banedanmark	Medium
48	21	Odense (Ekskl.) - Svendborg (Inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 10	Testkørsler Signalprogram	5 weekender á 56 timer	Juli-december	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Alle tog aflyses	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
49	23	Fredericia (Inkl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifte, ny sporkasse	56 timer	April-maj	30/04-02/05	Reduceret drift - Adgang til P-risten foregår gennem spor 42/43/50. Der kan ikke køres direkte fra spor 1-3 til P-rist/spor 404. Ingen kørestrøm i spor 47. Tog til nord kun 1-4	Banedanmark	*
50	23	Fredericia (Inkl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifte, ny sporkasse	5 døgn	Maj-maj	02/05-07/05	Reduceret drift - Der er spærret i spor 5 nord. LA 40 i spor 4 mod nord. Tog mod nord kun fra spor 1-4. Ingen kørestrøm i område V4. Ingen adgang til spor 46 og 47	Banedanmark	*
51	23	Fredericia (Inkl.) - Børkop (Ekskl.)	Fredericia station	Flytning af DV-signal, sporskiftearbejde, ny sporkasse	56 timer	Maj-maj	07/05-10/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Fredericia - Børkop. Spor 5 nord er spærret. Ingen adgang til spor 47	Banedanmark	Medium
52	23	Fredericia (Inkl.) - Børkop (Ekskl.)	Fredericia station	Flytning af DV-signal, ny sporkasse	64 timer	Maj-maj	10/05-12/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Fredericia - Børkop. Spor 5 nord er spærret. Ingen adgang til spor 47 fra banegården, ingen kørestrøm i spor 47. 8 timers natspærringer Fredericia - Børkop	Banedanmark	Medium
53	23	Fredericia (Inkl.) - Børkop (Ekskl.)	Fredericia station	Ilægning af nyt sporskifte, ny sporkasse, flytning af DV-signal	4,5 døgn	Maj-maj	12/05-17/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Fredericia - Børkop. Spor 5 nord spærret. Ingen adgang til spor 47	Banedanmark	Medium
54	23	Fredericia (Inkl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Flytning af DV-signal, ny sporkasse, udveksling af sporskifte, mv.	6 døgn	Maj-maj	17/05-23/05	Reduceret drift - Spor 2 og 3 kan ikke benyttes mod nord. Kørsel fra spor 4+5 mod nord foregår ved udrangering	Banedanmark	Medium
55	23	Fredericia (Inkl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifter, færdiggørelse af sporkasse	10 døgn	Maj-juni	23/05-02/06	Reduceret drift - Tog mod nord kan ikke benytte spor 4,5 og 6. Spor 31 og 32 spærret.	Banedanmark	Medium
56	23	Børkop (Inkl.) - Vejle (Ekskl.)	Forberende arbejder EP	Broarbejde	56 timer	Oktober-oktober	01/10-04/10	Alle spor spærret - Børkop - (Vejle)	Banedanmark	Medium
57	23	Horsens (Ekskl.) - Århus (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	11 nætter á 7 timer	Juni-juni	13/06-24/06	Alle spor spærret - Alle tog delaflyses mellem Horsens - Århus	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
58	23	Horsens (Inkl.) - Hovedgård (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	56 timer	Juli-august	30/07-02/08	Alle spor spærret - Alle tog delaflyses Horsens - Skanderborg	Banedanmark	Medium
59	23	Horsens (Ekskl.) - Århus (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	56 timer	Juni-juni	11/06-14/06	Alle spor spærret - Alle tog delaflyses mellem Horsens - Aarhus. Tog fra TIB 35 kan vende på Skanderborg station	Banedanmark	Medium
60	23	Horsens (Ekskl.) - Hovedgård (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	5 døgn	August-august	02/08-07/08	Reduceret drift - Kun et spor imellem Horsens og Hovedgaard	Banedanmark	*
61	23	Horsens (Ekskl.) - Hovedgaard (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	7 timer nat	August-august	12/08-13/08	Alle spor spærret - Horsens - Hovedgaard	Banedanmark	*
62	23	Horsens (Ekskl.) - Århus (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP fa-Ar	Broarbejder	56 timer	August-august	13/08-16/08	Alle spor spærret - Alle tog aflyses imellem Horsens og Århus. Tog fra TIB 35 kan vende på Skanderborg station	Banedanmark	Medium
63	23	Hovedgård (Ekskl.) - Aarhus (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	56 timer	Juli-juli	09/07-12/07	Alle spor spærret - Alle tog delaflyses Horsens - Århus. Tog fra Tib 35 kan vende på Skanderborg station	Banedanmark	Medium
64	23	Hovedgård (Ekskl.) - Aarhus (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	56 timer	Juli-juli	16/07-19/07	Alle spor spærret - Alle tog delaflyses Horsens - Århus. Tog fra TIB 35 kan vende på Skanderborg station	Banedanmark	Medium
65	23	Hovedgård (Ekskl.) - Horsens (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	5 døgn	August-august	07/08-12/08	Reduceret drift - Kun et spor imellem Horsens og Hovedgaard	Banedanmark	*
66	23	Hovedgård (Ekskl.) - Skanderborg (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP fa-Ar	Broarbejder	14 døgn	Oktober-oktober	10/10-25/10	Reduceret drift - Kun et spor imellem Skanderborg og Hovedgaard	Banedanmark	High
67	23	Skanderborg (Ekskl.) - Hovedgaard (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	10 døgn	Juli-juli	05/07-15/07	Reduceret drift - Kun et spor imellem Skanderborg og Hovedgaard	Banedanmark	High
68	23	Skanderborg (Inkl.) - Hovedgård (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	14 døgn	September-oktober	26/09-10/10	Reduceret drift - Kun et spor imellem Skanderborg og Hovedgaard	Banedanmark	High
69	23	Skanderborg (Ekskl.) - Hørning (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	48 timer	Juni-juni	28/06-30/06	Reduceret drift - Kun et spor imellem Skanderborg og Hørning	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
70	23	Skanderborg (Ekskl.) - Aarhus (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP Fa-Ar	Broarbejder	56 timer	Juni-juni	25/06-28/06	Alle spor spærret - Alle tog delaflyses mellem Horsens - Århus	Banedanmark	Medium
71	23	Aarhus (Ekskl.) - Hørning (Ekskl.)	Beder vejbro	Montage af broelementer for ny vejbro	1 døgn	April-september	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Venstresporskørsel Århus - Hørning	Aarhus Kommune (3. part)	Medium
72	23	Aarhus (Ekskl.) - Hørning (Ekskl.)	Beder vejbro	Nedrivning af eksisterende bro	56 timer	April-september	Ikke fastlagt	Alle spor spærret -	Aarhus kommune (3. part)	Medium
73	24	Århus (Ekskl.) - Brabrand (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	10,5 døgn	April-maj	23/04-07/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Århus-Brabrand. LA 40 over 200 meter	Banedanmark	High
74	24	Århus (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Nedrivning af broer på strækningen Ar-Lg	Nedrivning af broer på strækningen Århus - Langå	56 timer	Marts-marts	20/03-23/03	Alle spor spærret - Ingen tog mellem Århus og Langå	Banedanmark	Medium
75	24	Århus (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	10,5 døgn	Marts-april	26/03-06/04	Alle spor spærret -	Banedanmark	High
76	24	Århus (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	17 døgn	Maj-maj	07/05-25/05	Alle spor spærret -	Banedanmark	High
77	24	Århus (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	56 timer	August-august	06/08-09/08	Alle spor spærret - Ingen tog mellem Århus - Langå	Banedanmark	Medium
78	24	Århus (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus - Langå. 6 timers natspærringer 3 nætter pr. uge mandag-torsdag eller tirsdag-fredag i hele ombygningsperioden	6 timer pr. nat	April-september	06/04-13/09	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
79	24	Aarhus (Ekskl.) - Hobro (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejder	56 timer	Oktober-oktober	23/10-26/10	Alle spor spærret	Banedanmark	Medium
80	24	Brabrand (Ekskl.) - Århus (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	16,5 døgn	April-april	06/04-22/04	Reduceret drift - Venstresporskørsel Brabrand - Århus. LA 40 over 200 meter	Banedanmark	High
81	24	Brabrand (Inkl.) - Mundelstrup (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	22 døgn	Juni-juli	15/06-07/07	Reduceret drift - Venstresporskørsel Brabrand til Mundelstrup. LA 80 over 4 km	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
82	24	Brabrand (Inkl.) - Hinnerup (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	16 døgn	August-august	09/08-25/08	Reduceret drift - Venstresporskørsel Brabrand-Hinnerup. LA 80 7,5 km	Banedanmark	High
83	24	Mundelstrup (Inkl.) - Brabrand (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	7 døgn	Maj-juni	29/05-04/06	Reduceret drift - Venstresporskørsel Mundelstrup-Brabrand. LA80 over 4 km	Banedanmark	High
84	24	Mundelstrup (Ekskl.) - Brabrand (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	4 døgn	Maj-maj	25/05-29/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Mundelstrup-Brabrand. LA 80 6 km	Banedanmark	*
85	24	Mundelstrup (Inkl.) - Hinnerup (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	19 døgn	Juli-august	18/07-06/08	Reduceret drift - Venstresporskørsel Mundelstrup-Hinnerup. LA80 over 3 km	Banedanmark	High
86	24	Hinnerup (Inkl.) - Hadsten (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	18 døgn	Juni-juli	30/06-18/07	Reduceret drift - Venstresporskørsel Hinnerup - Hadsten. LA 80 over 3 km	Banedanmark	High
87	24	Hinnerup (Inkl.) - Brabrand (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	18,5 døgn	August-august	25/08-13/09	Reduceret drift - Venstresporskørsel Hinnerup-Brabrand. LA 80 over 7,5 km	Banedanmark	High
88	24	Hadsten (Inkl.) - Hadsten (Inkl.)	Århus-Langå	Sidespor Hadsten reserveret til logistikplads i hele ombygningsperioden	6 måneder	Marts-september	26/03-13/09	Sidespor i Hadsten kan ikke benyttes	Banedanmark	*
89	24	Hadsten (Inkl.) - Hinnerup (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	8 døgn	Maj-juni	29/05-04/06	Reduceret drift - Venstresporskørsel Hadsten-Hinnerup. LA80 over 4 km	Banedanmark	High
90	24	Langå (Ekskl.) - Randers (Ekskl.)	Forbedrende arbejde elektrificering Aarhus - Lindholm	Nedrivning af bro	33 timer	November-november	09/11-10/11	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
91	24	Randers (Ekskl.) - Hobro (Ekskl.)	Forbedrende arbejde elektrificering Aarhus - Lindholm	Nedrivning af bro	33 timer	April-april	03/04-04/04	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
92	24	Langå (Ekskl.) - Hadsten (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	11 døgn	Juni-juni	04/06-15/06	Reduceret drift - Venstresporskørsel Langå-Hadsten. LA 80 over 3 km	Banedanmark	High
93	24	Hadsten (Inkl.) - Hinnerup (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	11 døgn	Juni-juni	04/06-15/06	Reduceret drift - Venstresporskørsel Hadsten-Hinnerup. LA 80 over 2 km	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
94	24	Langå (Ekskl.) - Hadsten (Inkl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	15 døgn	Juni-juni	15/06-30/06	Reduceret drift - Venstresporskørsel Langå-Hadsten. LA80 over 4 km	Banedanmark	High
95	24	Hadsten (Inkl.) - Langå (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	11 døgn	Juli-juli	07/07-18/07	Reduceret drift - Dobbelt venstresporskørsel Hinnerup-Hadsten-Langå. LA 80 over 3 km	Banedanmark	High
96	24	Hadsten (Inkl.) - Langå (Ekskl.)	Århus-Langå	Sporombygning Århus-Langå	19 døgn	Juli-august	18/07-06/08	Reduceret drift - Venstresporskørsel Hadsten - Langå. LA 80 over 2 km.	Banedanmark	High
97	24	Langå (Inkl.) - Langå (Inkl.)	Langå station	Langå station	10 døgn	Marts-april	26/03-06/04	Alle spor spærret - Der opføres midlertidig perron så Arriva kan betjene strækningen Langå-Struer	Banedanmark	High
98	24	Langå (Inkl.) - Langå (Inkl.)	Langå station	Langå station	30 døgn	April-maj	06/04-07/05	Reduceret drift - Trafikken afvikles i spor 1 og 2.	Banedanmark	High
99	24	Langå (Inkl.) - Langå (Inkl.)	Langå station	Langå station	19 døgn	Maj-maj	07/05-25/05	Alle spor spærret - Der opsættes midlertidig perron så Arriva kan køre Langå-Struer	Banedanmark	High
100	24	Langå (Inkl.) - Langå (Inkl.)	Langå station	Langå station	40 døgn	Maj-juli	25/05-05/07	Reduceret drift - Tog benytter spor 3 og 4. Der opføres midlertidig perron, så Arriva kan køre Langå-Struer	Banedanmark	High
101	24	Langå (Inkl.) - Langå (Inkl.)	Langå station	Langå station	36 timer	September-september	17/09-19/09	Reduceret drift - Spor 1 og 4 kan benyttes	Banedanmark	*
102	24	Langå (Ekskl.) - Randers (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	72 timer	April-maj	28/04-01/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Langå - Randers	Banedanmark	*
103	24	Langå (Ekskl.) - Randers (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	24 timer	Maj-maj	03/05-04/05	Reduceret drift - Venstresporskørsel Langå - Randers	Banedanmark	*
104	24	Randers (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	48 timer	April-april	22/04-24/04	Reduceret drift - Venstresporskørsel Randers - Langå	Banedanmark	*
105	24	Randers (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	48 timer	April-april	26/04-28/04	Reduceret drift - Venstresporskørsel Randers - Langå	Banedanmark	*
106	24	Randers (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	24 timer	November-november	11/11-12/11	Reduceret drift - Venstresporskørsel Randers - Langå	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
107	24	Randers (Ekskl.) - Hobro (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	4 døgn	April-april	19/04-23/04	Reduceret drift - Venstresporskørsel Randers - Hobro	Banedanmark	*
108	24	Hobro (Ekskl.) - Randers (Ekskl.)	Forberedende arbejder EP	Broarbejde	48 timer	April-april	07/04-09/04	Reduceret drift - Venstresporskørsel Hobro - Randers	Banedanmark	*
109	26	Taulov (Ekskl.) - Fredericia (Inkl.)	Fredericia station	Udveksling af sporskifte	4 døgn og 8 timer	Marts-april	24/03-29/03	Reduceret drift - Ingen kørestrøm i spor 10. IC tog fra syd der skal koble med tog fra nord skal ad venstre spor fra Taulov, og skal ankomme først. Der er natspærringer i spor 7 mod syd, som medfører at der skal køres ad venstre spor mod Taulov. Tog fra nord der skal sydpå, skal ad venstre spor fra Børkop	Banedanmark	*
110	31	Holstebro (Ekskl.) - Struer (Inkl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Januar-januar	15/01-18/01	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
111	31	Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)	Signalprogram Vest	Aflåsning / ombygning af sporskifter til signalprogram	1 uge	Januar-januar	08/01-15/01	Lukkede løb, begrænset adgang til mdt, faste sporbenyttelser	Banedanmark	*
112	32	Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)	Signalprogram Vest	Aflåsning / ombygning af sporskifter til signalprogram	1 uge	Januar-januar	08/01-15/01	Lukkede løb, begrænset adgang til mdt, faste sporbenyttelser	Banedanmark	*
113	32	Viborg (Ekskl.) - Langå (Ekskl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Februar-marts	26/02-01/03	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
114	32	Skive (Ekskl.) - Rindsholm (Ekskl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Februar-februar	12/02-15/02	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
115	32	Skive (Ekskl.) - Struer (Inkl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Januar-januar	15/01-18/01	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
116	32	Struer (Ekskl.) - Viborg (Ekskl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Januar-februar	29/01-01/02	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
117	33	Herning (Ekskl.) - Vejle (Ekskl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	December-december	03/12-06/12	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
118	34	Hvidbjerg (Inkl.) - Hvidbjerg (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Nyt varslingsanlæg, ledelinjer samt niveaufri overgange	10 døgn	Q2	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Kun spor 2 kan benyttes. Ingen krydsninger på stationen	Banedanmark	*
119	34	Hvidbjerg (Inkl.) - Hvidbjerg (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	5 nætter á 8 timer	Q2	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Spor 1 og 2 er spærret	Banedanmark	*
120	34	Hvidbjerg (Inkl.) - Hvidbjerg (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	5 nætter á 10 timer	Q2	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Spor 1 er spærret	Banedanmark	*
121	34	Hvidbjerg (Inkl.) - Hvidbjerg (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	5 nætter á 10 timer	Q2	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Spor 2 spærret	Banedanmark	*
122	34	Hvidbjerg (Inkl.) - Hvidbjerg (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	4 nætter á 8 timer	Q2	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Spor 1 spærret	Banedanmark	*
123	34	Hvidbjerg (Ekskl.) - Struer (Inkl.)	Signalprogram vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Januar-januar	15/01-18/01	Alle spor spærret -	Banedanmark	Medium
124	34	Bedsted Thy (Inkl.) - Bedsted Thy (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	10 døgn	Q1	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Spor 1 er spærret. Der kan ikke krydses	Banedanmark	*
125	34	Bedsted Thy (Inkl.) - Bedsted Thy (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	5 nætter á 8 timer	Q1	Ikke fastlagt	Alle spor spærret - Spor 1 og 2 er spærret	Banedanmark	*
126	34	Bedsted Thy (Inkl.) - Bedsted Thy (Inkl.)	Ledelinjer og niveaufri adgang til Ø-perroner på TIB 25 og 34	Perronarbejder	12 nætter á 10 timer	Q1	Ikke fastlagt	Reduceret drift - Et spor spærret ad gangen	Banedanmark	*
127	34	Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)	Signalprogram Vest	Aflåsning / ombygning af sporskifter til signalprogram	1 uge	Januar-januar	08/01-15/01	Lukkede løb, begrænset adgang til mdt, faste sporbenyttelser	Banedanmark	*
128	35	Silkeborg (Inkl.) - Svejbæk (Ekskl.)	Etabling af Nordskovvej	Vejprojekt ved overkørsel 56	5 døgn	April-april	01/04-06/04	Alle spor spærret -	Silkeborg Kommune (3. part)	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	810	København H (Inkl.) - København H (Inkl.) Spor 9 fra I-signal Ø til Dværg N9	Sporombygning København H - Høje Taastrup	Sporombygning af fjernbanedelen af sporforbindelsen mellem fjern og nær	1 uge	Juli-juli	05/07-12/07	Reduceret drift - 20 minutters drift Valby - København H	Banedanmark	*
2	810	Valby (Ekskl.) - København H (Ekskl.)	Sporombygning København H - Høje Taastrup	Sporombygning	29 døgn	Juli-august	05/07-02/08	Reduceret drift - 20 minutters drift Valby - København H	Banedanmark	*
3	810	Valby (Inkl.) - Valby (Inkl.) Spor 3 fra PU K3 til spsk 02 (Eksl)	Sporombygning København H - Høje Taastrup	Omisolering af perrontunnel under spor 2/3	3 uger	Juli-juli	05/07-06/07	Reduceret drift - S-tog fra Høje Taastrup mod København kører igennem i spor 5	Banedanmark	*
4	810	Glostrup (Ekskl.) - Valby (Ekskl.)	Sporombygning København H - Høje Taastrup	Nødvendig spærring af S-banen ifb. ifb sporarbejder på fjern samt drænarbejder mellem S-bane og fjern	2 uger	August-august	02/08-16/08	Reduceret drift - 20 minutters drift Valby - Høje Taastrup	Banedanmark	*
5	810	Glostrup (Ekskl.) - Valby (Ekskl.)	Sporombygning København H - Høje Taastrup	Nødvendig spærring af S-banen ifb. ifb sporarbejder på fjern samt drænarbejder mellem S-bane og fjern	2 uger	August-september	23/08-06/09	Reduceret drift - 20 minutters drift Valby - Høje Taastrup	Banedanmark	*
6	810	Glostrup (Inkl.) - Glostrup (Inkl.) Spor 3 fra I-signal Æ til PU E3	Sporombygning København H - Høje Taastrup	Nødvendig spærring af S-banen ifb. ifb sporarbejder på fjern samt drænarbejder mellem S-bane og fjern	1 uge	August-september	30/08-06/09	Reduceret drift - 20 minutters drift Glostrup - Høje Taastrup. 10-minutters drift muligt Kh - Gl	Banedanmark	*
7	810	Glostrup (Inkl.) - Tåstrup (Ekskl.)	Hovedstadens Letbane ved Glostrup	Stålbros skal placeres over S-bane og Fjernbanespor parallelt ved Ringvejsbroen	1 weekend	Juli-juli	Uge 29	Alle spor spærret	Hovedstadens Letbane (3. part)	*
8	810	København H (inkl.) - Valby (inkl.)	Signalprogrammet Roll out centre test	Test	1 weekend á 56 timer		14/08-16/08	Alle spor spærret -	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
9	810	København H (Inkl.) - København H (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out centre test	Test, København H Øst og Vest	36 timer	April-april	17/04-18/04	Alle spor spærret - Spor 113, 114, 115 samt 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 137	Banedanmark	*
10	810	København H (inkl.) - Valby (inkl.)	Signalprogrammet Roll out centre test	Test	1 weekend á 56 timer	Maj-maj	08/05-10/05	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
11	820	Allerød (Ekskl.) - Hillerød (Ekskl.)	Favrholm Station	Indskubning af fodgængertunnel under banen	5 døgn	Marts-april	31/03-06/04	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
12	820	Svanemøllen (Inkl.) - Hillerød (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out North ibrugtagning	Ibrugtagning	3 timer	Januar-januar	25/01-25/01	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
13	820	København H (Inkl.) - Svanemøllen (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out centre test	Test	1 weekend á 56 timer	Maj-maj	08/05-10/05	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
14	820	København H (Inkl.) - Svanemøllen (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out centre test	Test	1 weekend á 56 timer	August-august	14/08-16/08	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
15	820	Nordhavn (Inkl.) - Jægersborg (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	5 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og alle stationer	Banedanmark	*
16	820	Østerport (Inkl.) - Nordhavn (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	5 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og Østerport spor 5	Banedanmark	*
17	820	Holte (Inkl.) - Jægersborg (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	6 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og alle stationer	Banedanmark	*
18	820	Hillerød (Inkl.) - Holte (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	7,5 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og alle stationer	Banedanmark	*
19	830	Herlev (Ekskl.) - Ballerup (Ekskl.)	Stitunnel Herlev	Indskubning af stitunnel under banen i km 13,03	80 timer	April-maj	29/04-03/05	Alle spor spærret -	Herlev Kommune (3. part)	*
20	840	Farum (Inkl.) - Svanemøllen (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out North ibrugtagning	Ibrugtagning	1 weekend á 56 timer	Januar-januar	23/01-25/01	Alle spor spærret	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
21	840	Farum (Inkl.) - Svanemøllen (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	5 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og alle stationer	Banedanmark	*
22	850	København H (Inkl.) - Åmarken	Signalprogrammet Roll out centre test	Test	1 weekend á 56 timer	Maj-maj	08/05-10/05	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
23	850	København H (Inkl.) - Åmarken	Signalprogrammet Roll out centre test	Test	1 weekend á 56 timer	August-august	14/08-16/08	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
24	860	Svanemøllen (Inkl.) - Klampenborg (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out North ibrugtagning	Ibrugtagning	1 weekend á 56 timer	Januar-januar	23/01-25/01	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
25	860	Klampenborg (Inkl.) - Hellerup (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	5 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og alle stationer	Banedanmark	*
26	880	Lersøen (Inkl.) - Nørrebro (Ekskl.)	Nordvestpassagen	Indskubning af 20 m bred fodgængerbro under banen	9 døgn	Juli-august	23/07-02/08	Alle spor spærret -	Københavns Kommune (3. part)	*
27	880	Hellerup (Inkl.) - Vigerslev (Inkl.)	Signalprogrammet Roll out North ibrugtagning	Ibrugtagning	1 weekend á 56 timer	Januar-januar	23/01-25/01	Alle spor spærret -	Banedanmark	*
28	880	Hellerup (Inkl.) - Ny Ellebjerg (Inkl.)	Signalprogrammet ibrugtagning af Moving Speed Restrictions	Ibrugtagning	5 timer	Juni-juni	13/06-13/06	Alle spor spærret - Begge strækningsspor og alle stationer	Banedanmark	*
